


REASENTAMIENTO SAN LORENZO (VIVIENDAS)

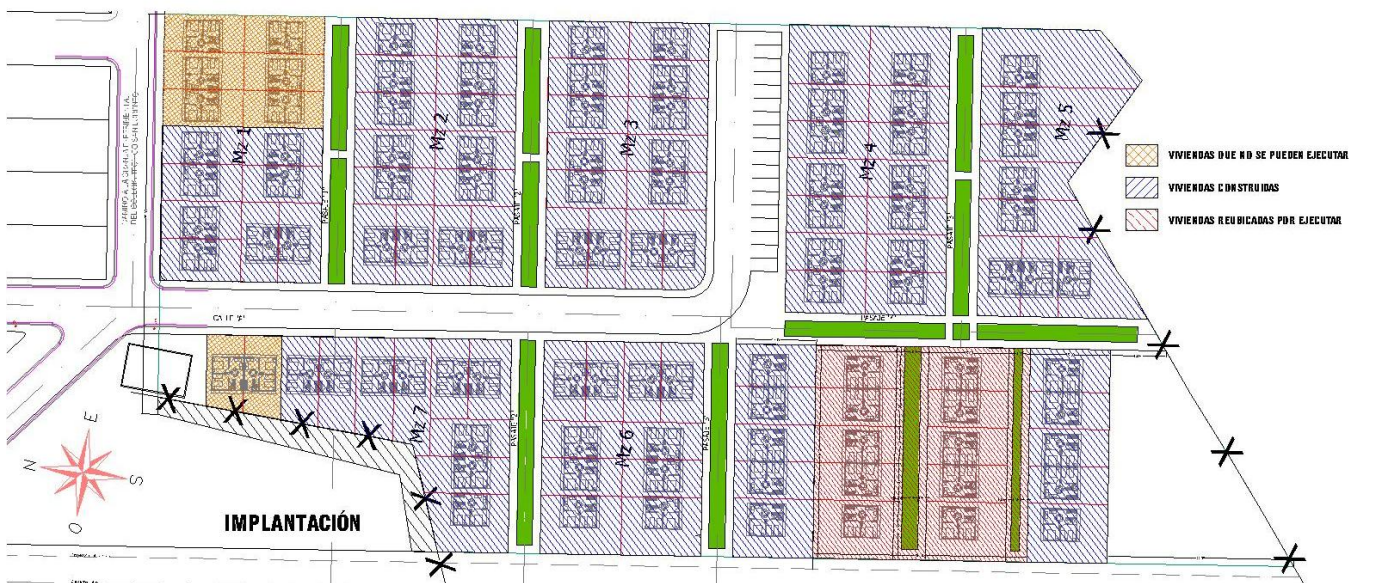

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTÓN	SAN LORENZO
PROYECTO	MALECÓN PARA SAN LORENZO
No. BENEFICIARIO	450
MONTO A INVERTIRSE	\$450.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS REASENTAMIENTO SAN LORENZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. THOMAS FIGUEROA.
MONTO DEL CONTRATO	\$446.023,48
MONTO DE ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/19/2009
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	21/01/2010
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	21/01/2010
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	92%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	21/06/2010
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
CODIGO y No. de CONTRATO	
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ING. DANNY CHACÓN
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$17.484,12
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ING. FRANKLIN CAISA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • EJECUCIÓN DETENIDA. • EXISTE CONFLICTO CON EX PROPIETARIA DEL PREDIO POR EL SITIO DONDE ESTA ASENTADAS LAS VIVIENDAS.

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2012
