


INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA REASENTAMIENTO SAN LORENZO

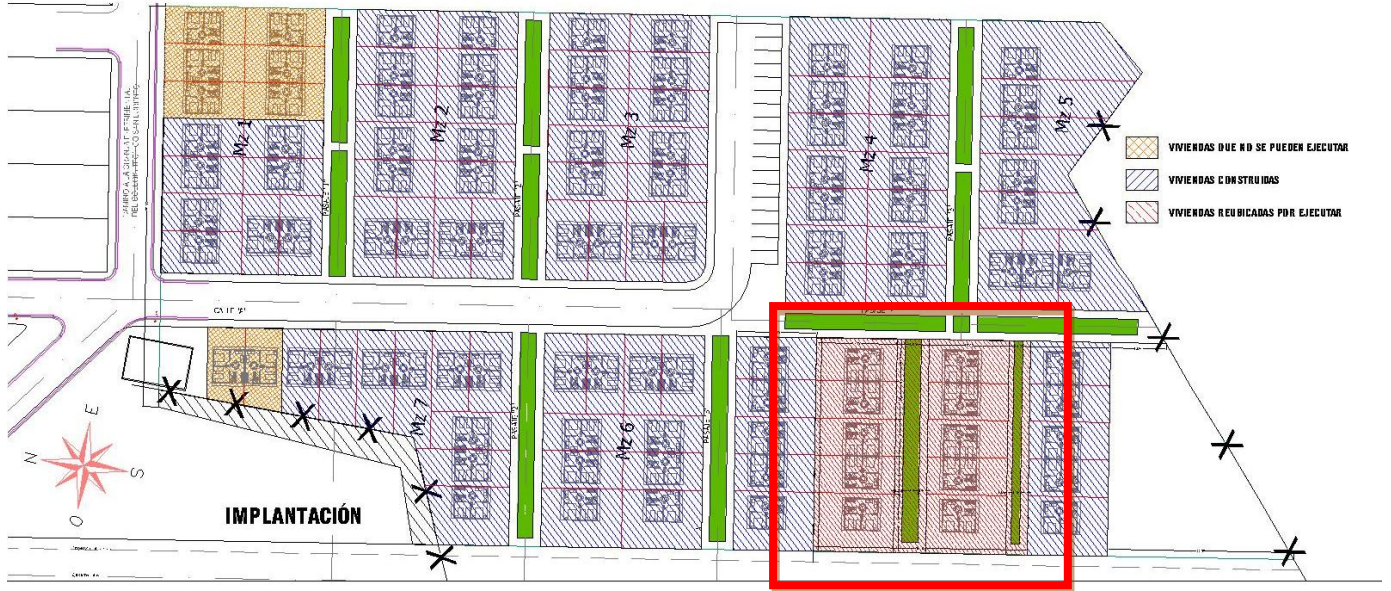

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTÓN	SAN LORENZO
PROYECTO	INFRAESTRUCTURA REASENTAMIENTO SAN LORENZO
No. BENEFICIARIOS	450
MONTO A INVERTIRSE	\$28000
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA REASENTAMIENTO SAN LORENZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. EDILFONSO GUSTAVO MONTENEGRO B.
MONTO DEL CONTRATO	\$27.871,90
MONTO ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01/07/2013
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	10/07/2013
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	10/07/2013
PLAZO CONTRACTUAL	42 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	100%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	0
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	0%
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	ING. LEINERT MONTAÑO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • OBRA CULMINADA

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

