


REASENTAMIENTO SAN LORENZO (VIVIENDAS)

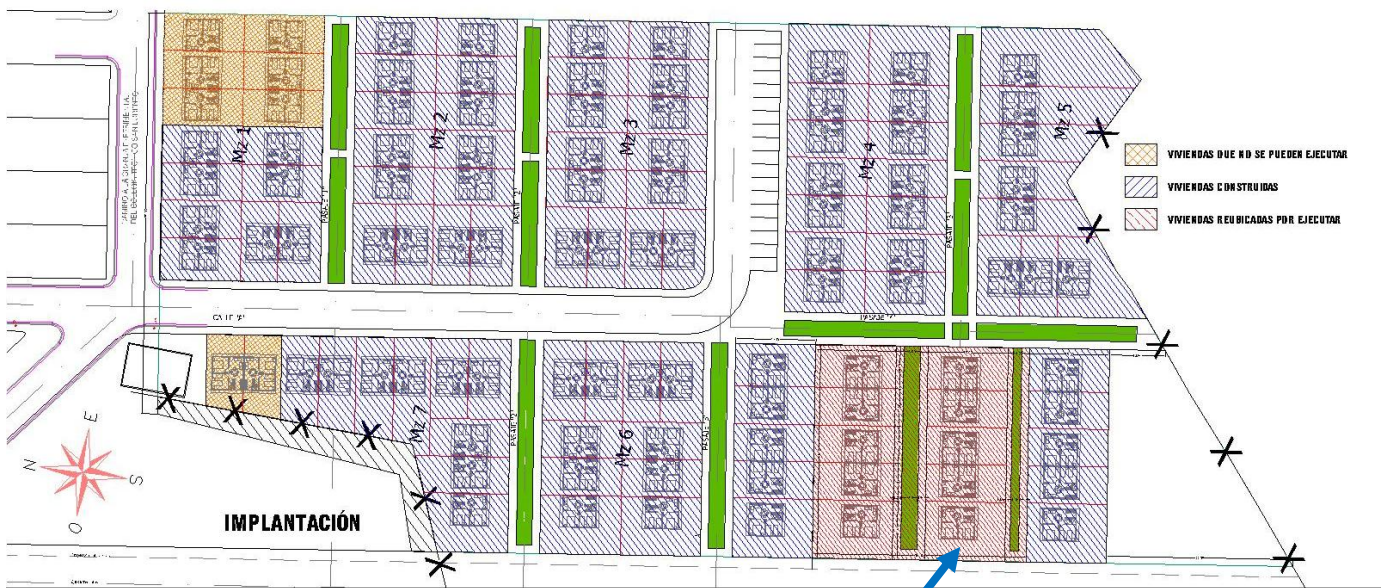

UBICACIÓN DE VIVIENDAS FALTANTES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
INFORME DEL PROYECTO

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTÓN	SAN LORENZO
PROYECTO	REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS SAN LORENZO
No. BENEFICIARIO	450
MONTO A INVERTIRSE	\$450.000,00
COSTO DEL TERRENO	
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS REASENTAMIENTO SAN LORENZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. THOMAS FIGUEROA.
MONTO DEL CONTRATO	\$446.023,48
MONTO ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/19/2009
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	21/01/2010
FECHA DE INICIO DE ESTUDIOS/OBRA	21/01/2010
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
PRORROGAS	
% DE AVANCE DE ESTUDIOS/OBRA	95%
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	21/06/2010
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA	
% DE ANTICIPO	50%
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	ING. DANNY CHACÓN
MONTO CONTRATO DE FISCALIZACIÓN	\$17.484,12
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • EN EJECUCIÓN VIVIENDAS RESTANTES.

Fecha de actualización: DICIEMBRE 2013

