


PARQUE LINEAL INFANTIL DE LIMONES

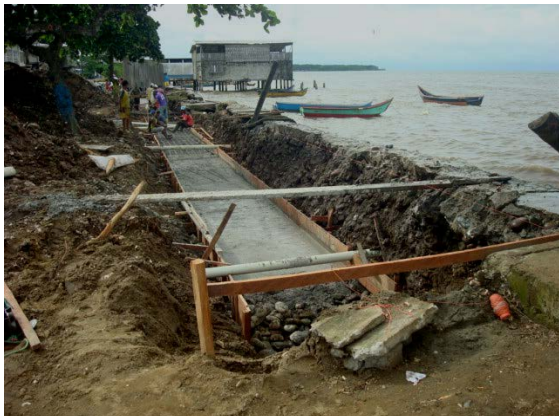

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**INFORME DEL PROYECTO**

PROVINCIA	ESMERALDAS
CANTON	ELOY ALFARO
PROYECTO	PARQUE INFANTIL LIMONES
NO. BENEFICIARIOS	6.906 Hbts.
MONTO INVERTIDO O MONTO A INVERTIRSE	\$550.000,00
COSTO DEL TERRENO	MUNICIPAL
OBJETIVO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL LIMONES
MONTO DEL CONTRATO	\$548.811,09
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	01/12/2010
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	16/12/2010
FECHA DE INICIO DE CONSTRUCCION	07/02/2011
PLAZO CONTRACTUAL	120
PRORROGAS	90 DIAS
% DE AVANCE DE OBRA	100%
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	07/06/2011
FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA	20/09/2011
% DE ANTICIPO	50%
MONTO DE ANTICIPO	\$274.405,55
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ING. DIEGO VINUEZA MOPOSITA
NOMBRE DEL FISCALIZADOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. FRANKLIN CAISA (ESMERALDAS)
OBSERVACIONES	<ul style="list-style-type: none">• PROYECTO CULMINADO.

Fecha de actualización: Diciembre 2011.
